

Id	EDT	Nombre de tarea	Entidad Responsable	Duración	Comienzo	Fin
0	0	Cronograma Proyecto I.E. Primitivo Crespo		456 días	1 jun '26	28 feb '28
1	1	Resolución de vinculación del impuesto	ART	0 días	1 jun '26	1 jun '26
2	2	Constitución de la fiducia y giro de los recursos	CONT	0 días	1 jun '26	1 jun '26
3	3	Inicio Proyecto		0 días	1 jun '26	1 jun '26
4	4	Ejecución Financiera		456 días	1 jun '26	28 feb '28
5	4.1	Precontractual		88 días	1 jun '26	30 sep '26
6	4.1.1	Inicio Precontractual		0 días	1 jun '26	1 jun '26
7	4.1.2	Revisión Documental		5 días	1 jun '26	5 jun '26
12	4.1.3	Contratación Gerencia del Proyecto		44 días	1 jun '26	30 jul '26
16	4.1.4	Contratación Interventoría de Obra		44 días	31 jul '26	30 sep '26
22	4.1.5	Contratación Supervisión Técnica (NSR-10)		44 días	31 jul '26	30 sep '26
28	4.1.6	Contratación Constructor		44 días	31 jul '26	30 sep '26
34	4.1.7	Fin Precontractual		0 días	30 sep '26	30 sep '26
35	4.2	Aprobación de Cronograma General		7 días	22 sep '26	30 sep '26
36	4.2.1	Presentación del Cronograma General de Obra	GER	7 días	22 sep '26	30 sep '26
37	4.2.2	Revisión y Aprobación del MEN, Interventoría y Gerencia	MEN	7 días	22 sep '26	30 sep '26
38	4.3	Sesión de Inicio de Obra		1 día	30 sep '26	1 oct '26
39	4.3.1	Acto de Inicio de Obra entre el MEN, ART, Interventoría y Gerencia	GER	0 días	30 sep '26	30 sep '26
40	4.3.2	Acta de Inicio de la Interventoría	FIDU	0 días	30 sep '26	30 sep '26
41	4.3.3	Acta de Inicio Supervisión Técnica	GER	0 días	30 sep '26	30 sep '26
42	4.3.4	Acta de Inicio de Obra	GER	1 día	1 oct '26	1 oct '26
43	4.4	Instalación de la Valla de Obra		15 días	25 sep '26	15 oct '26
44	4.4.1	Presentación diseño valla	CTR	5 días	25 sep '26	1 oct '26
45	4.4.2	Aprobación Gerencia/Interventoría de la valla	GER	5 días	2 oct '26	8 oct '26
46	4.4.3	Aprobación MEN de la valla	MEN	5 días	9 oct '26	15 oct '26
47	4.5	Ejecución Física (Construcción)		326 días	1 oct '26	30 dic '27
48	4.5.1	Inicio Obra		0 días	1 oct '26	1 oct '26
49	4.5.2	Capítulos de Obra		325 días	2 oct '26	30 dic '27
50	4.5.2.1	PRELIMINARES	CTR	60 días	2 oct '26	24 dic '26
51	4.5.2.2	MOVIMIENTOS DE TIERRA	CTR	90 días	2 oct '26	4 feb '27
52	4.5.2.3	CIMENTACIONES	CTR	90 días	2 oct '26	4 feb '27
53	4.5.2.4	ESTRUCTURAS	CTR	90 días	13 nov '26	18 mar '27
54	4.5.2.5	MAMPOSTERIAS	CTR	120 días	19 mar '27	2 sep '27
55	4.5.2.6	CONCRETOS MENORES	CTR	90 días	23 jul '27	25 nov '27
56	4.5.2.7	INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, GAS Y RCI	CTR	170 días	30 abr '27	23 dic '27
57	4.5.2.8	INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICAS, VOZ Y DATOS, SEGURIDAD, SONIDO	CTR	170 días	30 abr '27	23 dic '27
58	4.5.2.9	PAÑETES	CTR	60 días	30 abr '27	22 jul '27
59	4.5.2.10	PISOS	CTR	60 días	3 sep '27	25 nov '27
60	4.5.2.11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	CTR	90 días	30 abr '27	2 sep '27
61	4.5.2.12	CARPINTERIA METALICA	CTR	145 días	11 jun '27	30 dic '27
62	4.5.2.13	ENCHAPES Y RECUBRIMIENTOS	CTR	90 días	30 abr '27	2 sep '27
63	4.5.2.14	ILUMINACION	CTR	85 días	3 sep '27	30 dic '27
64	4.5.2.15	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	CTR	55 días	15 oct '27	30 dic '27
65	4.5.2.16	CIELOS RASOS Y DIVISIONES	CTR	60 días	11 jun '27	2 sep '27
66	4.5.2.17	ESTUCOS Y PINTURAS	CTR	55 días	15 oct '27	30 dic '27
67	4.5.2.18	CERRADURAS Y VIDRIOS	CTR	55 días	15 oct '27	30 dic '27
68	4.5.2.19	OBRAS EXTERIORES	CTR	145 días	11 jun '27	30 dic '27
69	4.5.2.20	VENTILACION MECANICA	CTR	60 días	3 sep '27	25 nov '27
70	4.5.2.21	SEÑALÉTICA	CTR	60 días	3 sep '27	25 nov '27
71	4.5.2.22	ASEO FINAL DE LA OBRA	CTR	85 días	3 sep '27	30 dic '27
72	4.5.3	Interventoría, Control y Seguimiento	INT	326 días	1 oct '26	30 dic '27
73	4.5.4	Supervisión Técnica (NSR-10)	STI	326 días	1 oct '26	30 dic '27
74	4.5.5	Dotación		109 días	2 ago '27	30 dic '27
75	4.5.5.1	Inicio Compra		0 días	2 ago '27	2 ago '27
76	4.5.5.2	Presentación de Prototipos y muestras del mobiliario y menaje	CTR	10 días	2 ago '27	13 ago '27
77	4.5.5.3	Aprobación de Prototipos y muestras del mobiliario y menaje	GER	5 días	16 ago '27	20 ago '27
78	4.5.5.4	Fabricación compra y alistamiento del mobiliario y menaje	GER	64 días	16 ago '27	11 nov '27
79	4.5.5.5	Control de calidad del mobiliario y menaje por parte de la Interventoría	INT	64 días	16 ago '27	11 nov '27
80	4.5.5.6	Entrega e instalación del mobiliario y menaje	GER	20 días	12 nov '27	9 dic '27
81	4.5.5.7	Informe de interventoría y acta de recibido final	INT	15 días	10 dic '27	30 dic '27

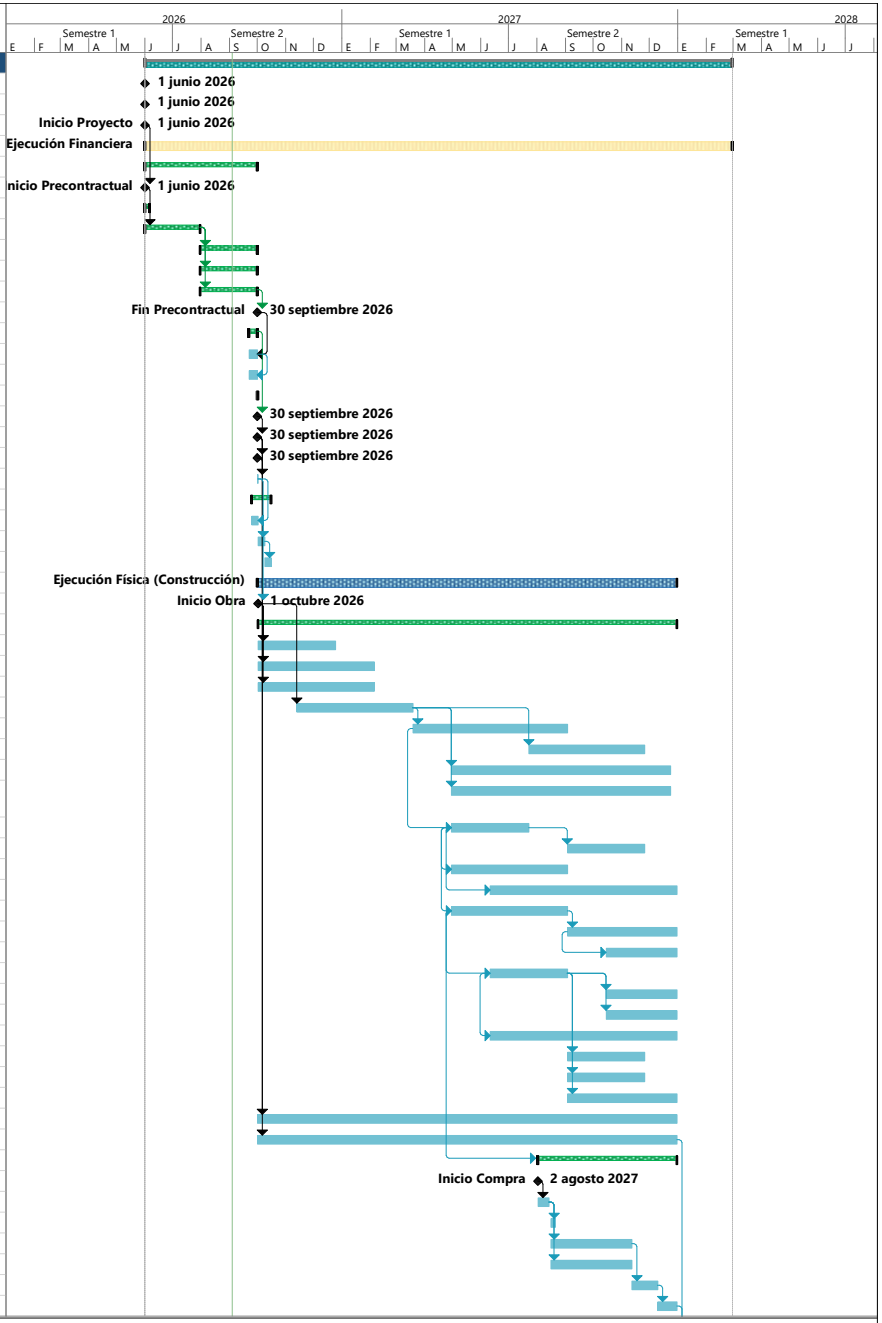

Proyecto: Cronograma Proyecto
Fecha: 4 sep '26

Tarea | Resumen del proyecto | Tarea manual | solo el comienzo | Fecha límite
División | Tarea inactiva | solo duración | solo fin | Progreso
Hito | Hito inactivo | Informe de resumen manual | Tareas externas | Progreso manual
Resumen | Resumen inactivo | Resumen manual | Hito externo

Id	EDT	Nombre de tarea	Entidad Responsable	Duración	Comienzo	Fin
82	4.5.5.8	Fin Compra	CTR	0 días	30 dic '27	30 dic '27
83	4.5.6	Fin de Obra		0 días	30 dic '27	30 dic '27
84	4.6	Entreaga del Proyecto		22 días	31 dic '27	31 ene '28
85	4.6.1	Acto protocolario	MEN	5 días	31 dic '27	6 ene '28
86	4.6.2	Entrega Informe Final de Interventoría	INT	15 días	31 dic '27	20 ene '28
87	4.6.3	Aprobación Informe Final de Interventoría	MEN	7 días	21 ene '28	31 ene '28
88	4.7	Liquidación		42 días	30 dic '27	28 feb '28
89	4.7.1	Inicio Liquidación		0 días	30 dic '27	30 dic '27
90	4.7.2	Gerencia del Proyecto	CONT	42 días	31 dic '27	28 feb '28
91	4.7.3	Interventoría de Obra	FIDU	22 días	31 dic '27	31 ene '28
92	4.7.4	Supervisión Técnica (NSR-10)	CONT	22 días	31 dic '27	31 ene '28
93	4.7.5	Constructor	FIDU	22 días	31 dic '27	31 ene '28
94	4.7.6	Fiducia	FIDU	42 días	31 dic '27	28 feb '28
95	4.7.7	Fin Liquidación		0 días	28 feb '28	28 feb '28
96	4.8	Expedición certificación MEN - DIAN	MEN	0 días	28 feb '28	28 feb '28
97	5	Fin Proyecto		0 días	28 feb '28	28 feb '28

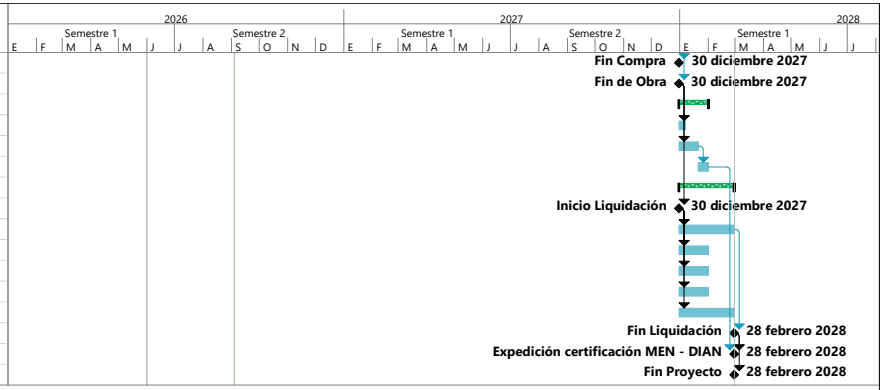

Proyecto: Cronograma Proyecto
Fecha: 4 sep '26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual
